



## Календарный график реализации проекта АПК Новая Жизнь



Идентификатор работы	Название работы	Начало	Окончание	Длительность	План. Общая стоимость	Календарный график																												
						С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я
Календарный график реализации проекта АПК Новая Жизнь																																		
Проектирование																																		
A23140	Работы по проектированию	10-Ноя-12 А	01-Фев-13	438	R45,000,000.00																													
A24930	Начало проектных и предпроектных работ	10-Ноя-12 А		0	R0.00																													
Предпроектные проработки																																		
Сбор исходных данных и анализ первоначальных предпроектных решений																																		
A23070	Сбор и анализ первоначальных предпроектных данных	12-Ноя-12 А	12-Дек-12 А	31	R0.00																													
Маркетинговые исследования																																		
A22900	Маркетинговые исследования	12-Ноя-12 А	20-Дек-12 А	39	R0.00																													
ТЭО																																		
A22910	Технико-экономические обоснования	12-Ноя-12 А	20-Дек-12 А	39	R0.00																													
Технологические решения и их поставщики																																		
A22920	Определение технологических решений и их поставщиков	20-Дек-12 А	04-Фев-13 А	39	R0.00																													
Разработка ТЗ и Технологической концепции																																		
A23080	Разработка ТЗ и Технологической концепции	04-Фев-13 А	20-Фев-13 А	17	R0.00																													
Получение замечаний по обновленной концепции с Н.Ж. и пот--ми поставщиками и согласование с Н.Ж.																																		
A23090	Получение замечаний по обновл. концепции с Н.Ж. и поставщиками и согласование с Н.Ж.	20-Фев-13 А	28-Мар-13 А	35	R0.00																													
Организация и выезд на объекты по ключевым направлениям АПК для проверки принятых решений																																		
A23100	Выезд на объекты по ключевым направлениям АПК для проверки принятых решений	29-Мар-13 А	30-Апр-13 А	33	R0.00																													
Получение и обработка полученных знаний, кризис-истори, негативный опыт для корректировки ТЗ и I																																		
A23110	Получение знаний, кризис-истори, негативного опыта. Корректировка ТЗ и Концепции	25-Янв-13 А	23-Фев-13 А	30	R0.00																													
Анализ и окончательный выбор ТХ решений с внесением корректировок в ТХ концепцию и ТЗ для поставщиков																																		
A23120	Анализ и выбор ТХ решений, внесение корректировок в ТХ и ТЗ для поставщиков	24-Фев-13 А	16-Мар-13 А	19	R0.00																													
Окончательная выдача ТЗ для поставщиков ТХО																																		
A23130	выдача ТЗ предполагаемым поставщикам ТХО	17-Мар-13 А	11-Апр-13 А	25	R0.00																													
Тендерная работа и контрактация																																		
Выбор генерального проектировщика																																		
A1000	Инициация тендера на выбор генерального проектировщика. Разработка ТЗ	12-Ноя-12 А	23-Ноя-12 А	10	R0.00																													
A1010	Проведение тендера на выбор генерального проектировщика	26-Ноя-12 А	04-Янв-13 А	30	R0.00																													
A1020	Заключение договора на разработку документации стадии "П"	07-Янв-13 А	18-Янв-13 А	10	R0.00																													
Выбор проектировщиков на спец. разделы																																		
A1030	Инициация тендера на выбор проектировщика по спец разделам. Разработка ТЗ	12-Ноя-12 А	23-Ноя-12 А	10	R0.00																													
A1040	Проведение тендера на выбор на выбор проектировщика по спец разделам.	26-Ноя-12 А	04-Янв-13 А	30	R0.00																													
A1050	Заключение договора на разработку спецразделов документации стадии "П"	07-Янв-13 А	18-Янв-13 А	10	R0.00																													
Выбор подрядчика на проведение инженерно-экологических изысканий																																		
A1120	Инициация тендера на проведение инженерно-экологических изысканий. Разработка ТЗ	18-Фев-13 А	22-Фев-13 А	5	R0.00																													
A1130	Проведение тендера на проведение инженерно-экологических изысканий	25-Фев-13 А	08-Мар-13 А	10	R0.00																													
A1140	Заключение договора на проведение инженерно-экологических изысканий	11-Мар-13 А	15-Мар-13 А	5	R0.00																													
Выбор подрядчика на проведение инженерно-геологических изысканий																																		
A1060	Инициация тендера на проведение инженерно-геологических изысканий. Разработка ТЗ	21-Янв-13 А	25-Янв-13 А	5	R0.00																													
A1070	Проведение тендера на выбор на проведение инженерно-геологических изысканий	28-Янв-13 А	08-Фев-13 А	10	R0.00																													
A1080	Заключение договора на проведение инженерно-геологических изысканий	11-Фев-13 А	15-Фев-13 А	5	R0.00																													
Выбор подрядчика на проведение инженерно-геодезических изысканий																																		
A1090	Инициация тендера на проведение инженерно-геодезических изысканий. Разработка ТЗ	21-Янв-13 А	25-Янв-13 А	5	R0.00																													
A1100	Проведение тендера на проведение инженерно-геодезических изысканий	28-Янв-13 А	08-Фев-13 А	10	R0.00																													
A1110	Заключение договора на проведение инженерно-геодезических изысканий	11-Фев-13 А	15-Фев-13 А	5	R0.00																													
Сбор исходно-разрешительной документации																																		

■ Remaining Level of Effort   
 ■ Actual Work   
 ■ Critical Remaining ...  
■ Actual Level of Effort   
 ■ Remaining Work   
 ◆ Milestone



## Календарный график реализации проекта АПК Новая Жизнь



Идентификатор работы	Название работы	Начало	Окончание	Длительность	План. Общая стоимость	Календарный график																												
						С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я
<b>Получение ТУ на подключение к городским сетям</b>						18-Фев-13 А → 30-Янв-14																												
A1270	Получение ТУ на подключение к сетям водоснабжения	18-Фев-13 А	05-Мар-13 А	12	R0.00	18-Фев-13 А → 05-Мар-13 А																												
A1300	Получение ТУ на подключение к сетям водоснабжения (хоз-бытовая)	18-Фев-13 А	20-Фев-13 А	3	R0.00	18-Фев-13 А → 20-Фев-13 А																												
A1320	Получение ТУ на подключение к сетям газоснабжения	17-Май-13 А	09-Сен-13 А	82	R0.00	17-Май-13 А → 09-Сен-13 А																												
A1310	Получение ТУ на подключение к сетям электроснабжения	25-Июл-13 А	31-Окт-13 А	71	R0.00	25-Июл-13 А → 31-Окт-13 А																												
A1280	Получение ТУ на подключение к сетям водоотведения (ливневая канализация)	10-Окт-13 А	14-Окт-13 А	3	R0.00	10-Окт-13 А → 14-Окт-13 А																												
A1330	Получение ТУ на подключение к сетям телефонизации, радиофикации	17-Окт-13 А	30-Янв-14	53	R0.00	17-Окт-13 А → 30-Янв-14																												
A1350	Получение ТУ на подключение к автомагистралям и устройство внутренних проездов	29-Ноя-13 А	30-Янв-14	30	R0.00	29-Ноя-13 А → 30-Янв-14																												
<b>Инженерно-изыскательские работы по объекту</b>						18-Фев-13 А → 05-Авг-13 А																												
<b>Инженерно-экологические изыскания</b>						18-Мар-13 А → 05-Авг-13 А																												
A1190	Проведение изысканий	18-Мар-13 А	05-Июл-13 А	80	R0.00	18-Мар-13 А → 05-Июл-13 А																												
A1200	Формирование отчета и согласование с уполномоченными инстанциями	08-Июл-13 А	05-Авг-13 А	21	R0.00	08-Июл-13 А → 05-Авг-13 А																												
<b>Инженерно-геодезические изыскания</b>						18-Фев-13 А → 05-Апр-13 А																												
A1150	Проведение изысканий	18-Фев-13 А	08-Мар-13 А	15	R0.00	18-Фев-13 А → 08-Мар-13 А																												
A1160	Формирование отчета и согласование с уполномоченными инстанциями	11-Мар-13 А	05-Апр-13 А	20	R0.00	11-Мар-13 А → 05-Апр-13 А																												
<b>Инженерно-геологические изыскания</b>						18-Фев-13 А → 12-Июл-13 А																												
A1170	Проведение изысканий	18-Фев-13 А	06-Июн-13 А	79	R0.00	18-Фев-13 А → 06-Июн-13 А																												
A1180	Формирование отчета и согласование с уполномоченными инстанциями	07-Июн-13 А	12-Июл-13 А	26	R0.00	07-Июн-13 А → 12-Июл-13 А																												
<b>Инженерно-изыскательские работы по сетям</b>						18-Фев-13 А → 03-Май-13 А																												
<b>Инженерно-геодезические изыскания</b>						18-Фев-13 А → 05-Апр-13 А																												
A1210	Проведение изысканий	18-Фев-13 А	08-Мар-13 А	15	R0.00	18-Фев-13 А → 08-Мар-13 А																												
A1220	Формирование отчета и согласование с уполномоченными инстанциями	11-Мар-13 А	05-Апр-13 А	20	R0.00	11-Мар-13 А → 05-Апр-13 А																												
<b>Инженерно-геологические изыскания</b>						18-Фев-13 А → 05-Апр-13 А																												
A1230	Проведение изысканий	18-Фев-13 А	08-Мар-13 А	15	R0.00	18-Фев-13 А → 08-Мар-13 А																												
A1240	Формирование отчета и согласование с уполномоченными инстанциями	11-Мар-13 А	05-Апр-13 А	20	R0.00	11-Мар-13 А → 05-Апр-13 А																												
<b>Инженерно-экологические изыскания</b>						18-Мар-13 А → 03-Май-13 А																												
A1250	Проведение изысканий	18-Мар-13 А	05-Апр-13 А	15	R0.00	18-Мар-13 А → 05-Апр-13 А																												
A1260	Формирование отчета и согласование с уполномоченными инстанциями	08-Апр-13 А	03-Май-13 А	20	R0.00	08-Апр-13 А → 03-Май-13 А																												
<b>Согласование актов размещения объектов и схем генеральных планов</b>						13-Апр-13 А → 30-Дек-13																												
A8240	Площадка № 1 - Инкубаторий	13-Апр-13 А	25-Апр-13 А	13	R0.00	13-Апр-13 А → 25-Апр-13 А																												
A8250	Площадка № 2 - Подращивание первого периода	13-Апр-13 А	25-Апр-13 А	13	R0.00	13-Апр-13 А → 25-Апр-13 А																												
A8260	Площадка № 3 - Выращивание 2 - го периода	13-Апр-13 А	25-Апр-13 А	13	R0.00	13-Апр-13 А → 25-Апр-13 А																												
A8270	Площадка № 4 - Выращивание 2 - го периода	13-Апр-13 А	25-Апр-13 А	13	R0.00	13-Апр-13 А → 25-Апр-13 А																												
A8290	Площадка № 6 - Убойный цех и перерабатывающий завод	20-Авг-13 А	03-Сен-13 А	15	R0.00	20-Авг-13 А → 03-Сен-13 А																												
A8280	Площадка № 5 - Пометохранилище	22-Дек-13 А	30-Дек-13	9	R0.00	22-Дек-13 А → 30-Дек-13																												
<b>Получение ГПЗУ</b>						13-Апр-13 А → 30-Дек-13																												
A8370	Площадка № 2 - Подращивание первого периода	13-Апр-13 А	29-Апр-13 А	10	R0.00	13-Апр-13 А → 29-Апр-13 А																												
A8380	Площадка № 3 - Выращивание 2 - го периода	13-Апр-13 А	29-Апр-13 А	10	R0.00	13-Апр-13 А → 29-Апр-13 А																												
A8360	Площадка № 1 - Инкубаторий	13-Апр-13 А	29-Апр-13 А	12	R0.00	13-Апр-13 А → 29-Апр-13 А																												
A8390	Площадка № 4 - Выращивание 2 - го периода	11-Май-13 А	28-Май-13 А	10	R0.00	11-Май-13 А → 28-Май-13 А																												
A8410	Площадка № 6 - Убойный цех и перерабатывающий завод	14-Авг-13 А	28-Авг-13 А	10	R0.00	14-Авг-13 А → 28-Авг-13 А																												
A8400	Площадка № 5 - Пометохранилище	22-Дек-13 А	30-Дек-13	9	R0.00	22-Дек-13 А → 30-Дек-13																												
<b>Получение заключения о применяемом газовом оборудовании по объектам</b>						10-Ноя-12 А → 09-Сен-13																												
A8460	Площадка № 5 - Пометохранилище	10-Ноя-12 А	19-Ноя-12	10	R0.00	10-Ноя-12 А → 19-Ноя-12																												
A8440	Площадка № 3 - Выращивание 2 - го периода	17-Май-13 А	17-Май-13 А	10	R0.00	17-Май-13 А → 17-Май-13 А																												
A8420	Площадка № 1 - Инкубаторий	17-Май-13 А	17-Май-13 А	10	R0.00	17-Май-13 А → 17-Май-13 А																												
A8430	Площадка № 2 - Подращивание первого периода	17-Май-13 А	17-Май-13 А	10	R0.00	17-Май-13 А → 17-Май-13 А																												

█ Remaining Level of Effort   
 █ Actual Work   
 █ Critical Remaining ...  
█ Actual Level of Effort   
 █ Remaining Work   
 ◆ Milestone







**Календарный график реализации проекта АПК  
Новая Жизнь**



Идентификатор работы	Название работы	Начало	Окончание	Длительность	План. Общая стоимость	Годы																																	
						С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	
A1510	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1520	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1530	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
<b>Инкуатор</b>		<b>18-Янв-13 А</b>	<b>31-Янв-14</b>	<b>438</b>	<b>R0.00</b>																																		
A1360	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																		
A1450	Технологические решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																		
A1460	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	343	R0.00																																		
A1470	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	343	R0.00																																		
A1370	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	298	R0.00																																		
A1380	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1390	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1400	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1410	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1420	Холодоснабжение	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1430	Сети связи	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1440	Система газоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
<b>Контрольно-пропускной пункт (КПП) с дезбарьером для грязной зоны</b>		<b>18-Янв-13 А</b>	<b>31-Янв-14</b>	<b>377</b>	<b>R0.00</b>																																		
A1580	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	24-Апр-13 А	95	R0.00																																		
A1650	Технологические решения	18-Янв-13 А	24-Апр-13 А	95	R0.00																																		
A1660	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																		
A1670	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																		
A1590	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1600	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1610	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1620	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1630	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A1640	Сети связи	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
<b>Пож. резервуары, насосная станция</b>		<b>18-Янв-13 А</b>	<b>31-Янв-14</b>	<b>393</b>	<b>R0.00</b>																																		
A2000	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																		
A2070	Технологические решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																		
A2060	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	298	R0.00																																		
A2080	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	298	R0.00																																		
A2090	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	298	R0.00																																		
A2010	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A2020	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A2030	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A2040	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
A2050	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																		
<b>Площадка № 2. Выращивание 1 периода</b>		<b>18-Янв-13 А</b>	<b>31-Янв-14</b>	<b>532</b>	<b>R0.00</b>																																		
A3470	Технологические решения	18-Янв-13 А	24-Апр-13 А	95	R0.00																																		
A3450	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	342	R0.00																																		
A3460	Система газоснабжения	25-Апр-13 А	31-Янв-14	342	R0.00																																		
A3490	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	25-Апр-13 А	31-Янв-14	342	R0.00																																		
A3500	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	25-Апр-13 А	31-Янв-14	342	R0.00																																		
A3510	Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности	25-Апр-13 А	31-Янв-14	342	R0.00																																		
A3520	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезы	25-Апр-13 А	31-Янв-14	342	R0.00																																		
A3530	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	342	R0.00																																		















**Календарный график реализации проекта АПК  
Новая Жизнь**



Идентификатор работы	Название работы	Начало	Окончание	Длительность	План. Общая стоимость	Год																																								
						С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И						
A4270	Система газоснабжения	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A4290	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A4300	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A4200	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	297	R0.00																																									
A4210	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	297	R0.00																																									
A4220	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	297	R0.00																																									
A4230	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	297	R0.00																																									
A4240	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	297	R0.00																																									
A4250	Холодоснабжение	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	297	R0.00																																									
<b>Автомойка</b>		18-Янв-13 А	31-Янв-14	376	R0.00																																									
A4480	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																									
A4550	Технологические решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																									
A4570	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A4540	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A4560	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A4490	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
A4500	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
A4510	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
A4520	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
A4530	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
<b>Птичник (16 шт.)</b>		18-Янв-13 А	31-Янв-14	392	R0.00																																									
A3550	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																									
A3630	Технологические решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																									
A3610	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00																																									
A3620	Система газоснабжения	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00																																									
A3640	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00																																									
A3650	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00																																									
A3560	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
A3570	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
A3580	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
A3590	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
A3600	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																																									
<b>Газораспределительный пункт (ГРП)</b>		18-Янв-13 А	31-Янв-14	392	R0.00																																									
A3660	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																									
A3700	Система газоснабжения	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00																																									
A3710	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00																																									
A3720	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00																																									
A3670	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	297	R0.00																																									
A3680	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	297	R0.00																																									
A3690	Сети связи	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	297	R0.00																																									
<b>Площадка № 4. Выращивание 2 периода</b>		18-Янв-13 А	31-Янв-14	392	R0.00																																									
A6050	Технологические решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00																																									
A6030	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A6040	Система газоснабжения	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A6060	Проект организации строительства	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A6070	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									
A6080	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00																																									

■ Remaining Level of Effort     
 ■ Actual Work     
 ■ Critical Remaining ...  
■ Actual Level of Effort     
 ■ Remaining Work     
 ◆ Milestone





## Календарный график реализации проекта АПК Новая Жизнь



Идентификатор работы	Название работы	Начало	Окончание	Длительность	План. Общая стоимость	Календарный график																												
						С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я
<b>Гараж для с/х техники со складом дезсредств</b>						18-Янв-13 А → 31-Янв-14																												
A5020	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00	18-Янв-13 А → 25-Апр-13 А																												
A5090	Технологические решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00	18-Янв-13 А → 25-Апр-13 А																												
A5080	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5100	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5110	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5030	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5040	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5050	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5060	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5070	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
<b>Склад подстилки</b>						18-Янв-13 А → 31-Янв-14																												
A5120	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00	18-Янв-13 А → 25-Апр-13 А																												
A5160	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5170	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5180	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5130	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5140	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5150	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
<b>Автомойка</b>						18-Янв-13 А → 31-Янв-14																												
A5190	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00	18-Янв-13 А → 25-Апр-13 А																												
A5260	Технологические решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00	18-Янв-13 А → 25-Апр-13 А																												
A5250	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5270	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5280	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5200	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5210	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5220	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5230	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5240	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
<b>Контрольно-пропускной пункт (КПП) с дезбарьером для грязной зоны</b>						18-Янв-13 А → 31-Янв-14																												
A5290	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00	18-Янв-13 А → 25-Апр-13 А																												
A5360	Технологические решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00	18-Янв-13 А → 25-Апр-13 А																												
A5380	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5350	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5370	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	297	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5300	Конструктивные и объемно-планировочные решения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5310	Система электроснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5320	Система водоснабжения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5330	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
A5340	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00	25-Апр-13 А → 6-Дек-13 А																												
<b>Газораспределительный пункт (ГРП)</b>						18-Янв-13 А → 31-Янв-14																												
A5390	Архитектурные решения	18-Янв-13 А	25-Апр-13 А	95	R0.00	18-Янв-13 А → 25-Апр-13 А																												
A5420	Сети связи	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5430	Система газоснабжения	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5440	Сметная документация	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												
A5450	Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС)	25-Апр-13 А	31-Янв-14	281	R0.00	25-Апр-13 А → 31-Янв-14																												

█ Remaining Level of Effort   
 █ Actual Work   
 █ Critical Remaining ...  
█ Actual Level of Effort   
 █ Remaining Work   
 ◆ Milestone



Календарный график реализации проекта АПК Новая Жизнь



Table with columns: Идентификатор работы, Название работы, Начало, Окончание, Длительность, План. Общая стоимость, and Gantt chart columns (С, О, Н, Д, Я, Ф, М, А, М, И, И, А, С, О, Н, Д, Я, Ф, М, А, М, И, И, А, С, О, Н, Д, Я, Ф, М, А, М, И, И). Rows include categories like Локальные очистные сооружения (ЛОС), Водозаборный узел (ВЗУ), ТП, Пож. Резервуары, насосная станция, and Площадка № 5.

Legend: Remaining Level of Effort (red), Actual Work (blue), Critical Remaining (red), Actual Level of Effort (blue), Remaining Work (green), Milestone (diamond).



Календарный график реализации проекта APK
Новая Жизнь



Table with columns: Идентификатор работы, Название работы, Начало, Окончание, Длительность, План. Общая стоимость, and a grid for days of the month from 18-Jan-13 to 31-Jan-14. It contains rows for various construction tasks like 'Площадка № 6', 'Котельная', and 'Вспомогательный корпус'.

Legend for work status: Remaining Level of Effort, Actual Work, Critical Remaining, Actual Level of Effort, Remaining Work, Milestone.









Календарный график реализации проекта АПК Новая Жизнь



Идентификатор работы	Название работы	Начало	Окончание	Длительность	План. Общая стоимость	Календарный график																			
						С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А
A7800	Система водоотведения	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																				
A7810	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	25-Апр-13 А	16-Дек-13 А	235	R0.00																				
	Согласование ПД с государственными органами	01-Фев-14	28-Фев-14	28	R0.00																				
A8070	Согласование документации стадии "П". Площадка № 6. Птицекомбинат	01-Фев-14*	28-Фев-14	28	R0.00																				
A8020	Согласование документации стадии "П". Площадка № 1. Инкубаторий	01-Фев-14*	28-Фев-14	28	R0.00																				
A8030	Согласование документации стадии "П". Площадка № 2. Выращивание 1-го периода	01-Фев-14*	28-Фев-14	28	R0.00																				
A8040	Согласование документации стадии "П". Площадка № 3,4,5. Выращивание 2-го периода	01-Фев-14*	28-Фев-14	28	R0.00																				
	Прохождение государственной экспертизы	17-Фев-14	01-Мар-14	13	R0.00																				
A8130	Проведение экспертизы документации стадии "П". Площадка № 6. Птицекомбинат	17-Фев-14*	01-Мар-14	13	R0.00																				
A8080	Проведение экспертизы документации стадии "П". Площадка № 1. Инкубаторий	17-Фев-14*	01-Мар-14	13	R0.00																				
A8090	Проведение экспертизы документации стадии "П". Площадка № 2. Выращивание 1-го пер	17-Фев-14*	01-Мар-14	13	R0.00																				
A8100	Проведение экспертизы документации стадии "П". Площадка № 3,4,5.	17-Фев-14*	01-Мар-14	13	R0.00																				
	Строительно-монтажные работы	09-Янв-13	26-Мар-15	805	R2,306,674,419.70																				
	Тендерная работа и заключение договоров	12-Янв-15	20-Мар-15	50	R0.00																				
	Выбор генерального подрядчика	12-Янв-15	20-Мар-15	50	R0.00																				
A8150	Инициация тендера на выбор генерального подрядчика. Разработка ТЗ	12-Янв-15*	23-Янв-15	10	R0.00																				
A8160	Проведение тендера на выбор генерального подрядчика	26-Янв-15*	06-Мар-15	30	R0.00																				
A8170	Заключение договора генерального подряда	09-Мар-15*	20-Мар-15	10	R0.00																				
	Получение разрешения на строительство	03-Мар-14	28-Мар-14	20	R0.00																				
A8230	Получение разрешения на строительство. Площадка № 6. Птицекомбинат	03-Мар-14*	28-Мар-14	20	R0.00																				
A8180	Получение разрешения на строительство. Площадка № 1. Инкубаторий	03-Мар-14	28-Мар-14	20	R0.00																				
A8190	Получение разрешения на строительство. Площадка № 2. Выращивание 1-го периода	03-Мар-14*	28-Мар-14	20	R0.00																				
A8200	Получение разрешения на строительство. Площадка № 3,4,5	03-Мар-14*	28-Мар-14	20	R0.00																				
	Поставка технологического оборудования	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R579,152,549.25																				
	Площадка № 1. Инкубаторий	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R12,922,790.40																				
	Инкубатор	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R12,922,790.40																				
A8660	Заказ оборудования Petersime для инкубатора	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R12,922,790.40																				
	Площадка № 2. Выращивание 1 периода	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R47,288,829.60																				
	Птичник (8 шт.)	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R47,288,829.60																				
A8680	Заказ оборудования Вентиляции SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) для птичника подращ	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R13,021,992.00																				
A8690	Заказ оборудования Отопления SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) для птичника подращ	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R3,080,980.80																				
A8700	Заказ оборудования Подогрева притока воздуха SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) для пт	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R9,415,641.60																				
A8710	Заказ оборудования Общего воздуховода корпуса SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) для г	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R290,016.00																				
A8720	Заказ оборудования Увлажнения высокого давления SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) дл	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R2,013,523.20																				
A8730	Заказ оборудования Материал для техобслуживания SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) дл	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R28,051.20																				
A8740	Заказ оборудования Подключения сигнализации SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) для пт	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R129,024.00																				
A8750	Заказ оборудования Центральный компьютер SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) для птич	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R136,224.00																				
A8760	Заказ оборудования Сигнализация - Alarme SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) для птични	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R467,712.00																				
A8770	Заказ оборудования Освещения PAL Industries RUS (Германия) для птичника подращ	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R2,586,168.00																				
A8780	Заказ оборудования Системы кормления и поения PAL Industries RUS (Германия) для птич	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R13,488,256.80																				
A8790	Заказ оборудования Система взвешивания птицы SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) для	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R1,180,800.00																				
A8800	Заказ оборудования Управления и контроль SAS TUFFIGO RAPIDEX (Франция) для птични	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R1,450,440.00																				
	Площадка № 3. Выращивание 2 периода	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R75,482,136.00																				
	Птичник (16 шт.)	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R75,482,136.00																				
A8810	Заказ оборудования Вентиляции PAL Industries RUS (Германия) для птичника выращивания	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R24,536,160.00																				
A8820	Заказ оборудования Светодиодное освещение PAL Industries RUS (Германия) для птичник	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R3,723,120.00																				
A8830	Заказ оборудования Система кормления и поения PAL Industries RUS (Германия) для птич	15-Апр-14	18-Апр-14	3	R26,742,456.00																				

■ Remaining Level of Effort 
 ■ Actual Work 
 ■ Critical Remaining ...  
■ Actual Level of Effort 
 ■ Remaining Work 
 ◆ Milestone















### Календарный график реализации проекта АПК Новая Жизнь



Идентификатор работы	Название работы	Начало	Окончание	Длительность	План. Общая стоимость	Календарный график																														
						С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И								
A19360	Монтаж несущего каркаса из ЛСТК	29-Май-14	12-Июл-14	45	R1,097,880.72												29-Май-14																			
	Монтаж ограждающих конструкций (наружные стены и кровля)	12-Июл-14	25-Авг-14	45	R1,701,563.03																															
A19370	Монтаж обшивки (наружных стен и кровли)	12-Июл-14	25-Авг-14	45	R1,701,563.03																															
	Устройство промышленных полов	25-Авг-14	22-Сен-14	29	R469,557.00																															
A19380	Подготовка основания под промышленные полы	25-Авг-14	08-Сен-14	15	R307,071.00																															
A19390	Устройство финишного покрытия полов	08-Сен-14	22-Сен-14	15	R162,486.00																															
	Устройство внутренних сетей инженерно-технологического обеспечения	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R885,411.00																															
	Устройство в.с. электроснабжения	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R137,700.00																															
A19270	Устройство в.с. электроснабжения	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R137,700.00																															
	Устройство в.с. хол. гор. водоснабжения	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R88,128.00																															
A19280	Устройство хол. гор. водоснабжения	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R88,128.00																															
	Устройство в.с. канализации	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R64,719.00																															
A19290	Устройство канализации	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R64,719.00																															
	Устройство отопления, кондиционирования, вентиляции	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R426,870.00																															
A19300	Устройство отопления, кондиционир., вентиляции	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R426,870.00																															
	Устройство в.с. сетей связи и сигнализации (слаботочка, пожбез и т.д.)	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R167,994.00																															
A19310	Устройство в.с. слаботочка, пожбез и т.д.	22-Сен-14	05-Ноя-14	45	R167,994.00																															
	Устройство инженерно-технологического обеспечения ТХ	05-Ноя-14	04-Дек-14	30	R0.00																															
	Монтаж специализированного технологического оборудования	05-Ноя-14	04-Дек-14	30	R0.00																															
A19340	Работы по монтажу ТХО	05-Ноя-14	04-Дек-14	30	R0.00																															
	Водозаборный узел (ВЗУ)	15-Апр-14	14-Май-14	30	R10,500,000.00																															
A24620	Устройство ВЗУ	15-Апр-14	14-Май-14	30	R10,500,000.00																															
	Склад подстилки	15-Апр-14	13-Дек-14	243	R6,221,160.00																															
	Устройство фундаментов	15-Апр-14	29-Май-14	45	R403,787.52																															
A17170	Устройство монолитных железобетонных отдельных фундаментов под колонны	15-Апр-14	29-Май-14	45	R403,787.52																															
	ОНК	29-Май-14	22-Сен-14	117	R4,214,085.12																															
	Монтаж несущего каркаса	29-Май-14	12-Июл-14	45	R809,611.20																															
A17190	Монтаж несущего каркаса из ЛСТК	29-Май-14	12-Июл-14	45	R809,611.20																															
	Монтаж ограждающих конструкций (наружные стены и кровля)	12-Июл-14	25-Авг-14	45	R2,520,601.92																															
A17210	Монтаж обшивки (наружных стен и кровли)	12-Июл-14	25-Авг-14	45	R2,520,601.92																															
	Устройство промышленных полов	25-Авг-14	22-Сен-14	29	R883,872.00																															
A17220	Подготовка основания под промышленные полы	25-Авг-14	08-Сен-14	15	R578,016.00																															
A17230	Устройство финишного покрытия полов	08-Сен-14	22-Сен-14	15	R305,856.00																															
	Устройство внутренних перегородок	22-Сен-14	01-Окт-14	10	R0.00																															
A17240	Монтаж внутренних перегородок	22-Сен-14	01-Окт-14	10	R0.00																															
	Внутренние отделочные работы	14-Ноя-14	17-Ноя-14	3	R0.00																															
A17250	Отделочные работы	14-Ноя-14	17-Ноя-14	3	R0.00																															
	Устройство внутренних сетей инженерно-технологического обеспечения	01-Окт-14	14-Ноя-14	45	R1,188,288.00																															
	Устройство в.с. электроснабжения	01-Окт-14	14-Ноя-14	45	R116,928.00																															
A17260	Устройство в.с. электроснабжения	01-Окт-14	14-Ноя-14	45	R116,928.00																															
	Устройство отопления, кондиционирования, вентиляции	01-Окт-14	14-Ноя-14	45	R892,800.00																															
A17310	Устройство вентиляции	01-Окт-14	14-Ноя-14	45	R892,800.00																															
	Устройство в.с. сетей связи и сигнализации (слаботочка, пожбез и т.д.)	01-Окт-14	14-Ноя-14	45	R178,560.00																															
A17270	Устройство в.с. слаботочка, пожбез и т.д.	01-Окт-14	14-Ноя-14	45	R178,560.00																															
	Монтаж заполнение оконных и дверных проемов	14-Ноя-14	13-Дек-14	30	R414,999.36																															
A17280	Монтажные работы оконных и дверных проемов	14-Ноя-14	13-Дек-14	30	R414,999.36																															
	Наружные отделочные работы по зданию	14-Ноя-14	13-Дек-14	30	R0.00																															

█ Remaining Level of Effort   
 █ Actual Work   
 █ Critical Remaining ...  
█ Actual Level of Effort   
 █ Remaining Work   
 ◆ Milestone













## Календарный график реализации проекта АПК Новая Жизнь



Идентификатор работы	Название работы	Начало	Окончание	Длительность	План. Общая стоимость	Календарный график (С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И)																	
						2014			2015			2016			2017								
	Устройство инженерно-технологического обеспечения ТХ	25-Фев-15	26-Мар-15	30	R0.00																25-Фев-15	26-Мар-15	
	Монтаж специализированного технологического оборудования	25-Фев-15	26-Мар-15	30	R0.00																25-Фев-15	26-Мар-15	
	A20870 Работы по монтажу ТХО	25-Фев-15	26-Мар-15	30	R0.00																25-Фев-15	26-Мар-15	
	Газораспределительный пункт (ГРП)	15-Апр-14	29-Май-14	45	R200,000.00																15-Апр-14	29-Май-14	
A24740	Устройство ГРПШ	15-Апр-14	29-Май-14	45	R200,000.00																15-Апр-14	29-Май-14	
	Автомойка	29-Май-14	14-Фев-15	262	R5,281,427.87																29-Май-14	14-Фев-15	
	Устройство фундамента	29-Май-14	12-Июл-14	45	R457,824.77																29-Май-14	12-Июл-14	
A21180	устройства фундамента с цоколем, согласно проекту марки ЮЖ( конструкции железобетона)	29-Май-14	12-Июл-14	45	R457,824.77																29-Май-14	12-Июл-14	
	Монтаж заполнения оконных и дверных проемов	07-Янв-15	26-Янв-15	20	R273,006.65																07-Янв-15	26-Янв-15	
A21150	Монтажные работы оконных и дверных проемов	07-Янв-15	26-Янв-15	20	R273,006.65																07-Янв-15	26-Янв-15	
	ОНК	12-Июл-14	05-Ноя-14	117	R3,416,537.35																12-Июл-14	05-Ноя-14	
	Монтаж несущего каркаса	12-Июл-14	25-Авг-14	45	R1,076,687.70																12-Июл-14	25-Авг-14	
A21190	Монтаж несущего каркаса из ЛСТК	12-Июл-14	25-Авг-14	45	R1,076,687.70																12-Июл-14	25-Авг-14	
	Монтаж ограждающих конструкций (наружные стены и кровля)	25-Авг-14	08-Окт-14	45	R1,798,570.11																25-Авг-14	08-Окт-14	
A21200	Монтаж обшивки (наружных стен и кровли)	25-Авг-14	08-Окт-14	45	R1,798,570.11																25-Авг-14	08-Окт-14	
	Устройство промышленных полов	08-Окт-14	05-Ноя-14	29	R541,279.53																08-Окт-14	05-Ноя-14	
A21210	Подготовка основания под промышленные полы	08-Окт-14	22-Окт-14	15	R353,974.59																08-Окт-14	22-Окт-14	
A21220	Устройство финишного покрытия полов	22-Окт-14	05-Ноя-14	15	R187,304.94																22-Окт-14	05-Ноя-14	
	Наружные отделочные работы по зданию	26-Янв-15	14-Фев-15	20	R0.00																26-Янв-15	14-Фев-15	
A21160	Отделочные работы по зданию нар.	26-Янв-15	14-Фев-15	20	R0.00																26-Янв-15	14-Фев-15	
	Устройство внутренних перегородок	05-Ноя-14	24-Ноя-14	20	R0.00																05-Ноя-14	24-Ноя-14	
A21230	Монтаж внутренних перегородок	05-Ноя-14	24-Ноя-14	20	R0.00																05-Ноя-14	24-Ноя-14	
	Внутренние отделочные работы	24-Ноя-14	23-Дек-14	30	R0.00																24-Ноя-14	23-Дек-14	
A21240	Отделочные работы	24-Ноя-14	23-Дек-14	30	R0.00																24-Ноя-14	23-Дек-14	
	Устройство внутренних сетей инженерно-технологического обеспечения	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R1,134,059.10																24-Ноя-14	07-Янв-15	
	Устройство в.с. электроснабжения	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R176,370.00																24-Ноя-14	07-Янв-15	
A21100	Устройство в.с. электроснабжения	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R176,370.00																24-Ноя-14	07-Янв-15	
	Устройство в.с. хол. гор. водоснабжения	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R112,876.80																24-Ноя-14	07-Янв-15	
A21110	Устройство хол. гор. водоснабжения	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R112,876.80																24-Ноя-14	07-Янв-15	
	Устройство в.с. канализации	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R82,893.90																24-Ноя-14	07-Янв-15	
A21120	Устройство канализации	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R82,893.90																24-Ноя-14	07-Янв-15	
	Устройство отопления, кондиционирования, вентиляции	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R546,747.00																24-Ноя-14	07-Янв-15	
A21130	Устройство отопления, кондиционир., вентиляции	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R546,747.00																24-Ноя-14	07-Янв-15	
	Устройство в.с. сетей связи и сигнализации (слаботочка, пожбез и т.д.)	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R215,171.40																24-Ноя-14	07-Янв-15	
A21140	Устройство в.с. слаботочка, пожбез и т.д.	24-Ноя-14	07-Янв-15	45	R215,171.40																24-Ноя-14	07-Янв-15	
	Устройство инженерно-технологического обеспечения ТХ	07-Янв-15	05-Фев-15	30	R0.00																07-Янв-15	05-Фев-15	
	Монтаж специализированного технологического оборудования	07-Янв-15	05-Фев-15	30	R0.00																07-Янв-15	05-Фев-15	
A21170	Работы по монтажу ТХО	07-Янв-15	05-Фев-15	30	R0.00																07-Янв-15	05-Фев-15	
	Площадка № 4. Выращивание 2 периода	09-Янв-13	17-Мар-15	796	R340,104,377.88	09-Янв-13																17-Мар-15	
	Внутриплощадочные наружные работы	15-Апр-14	12-Июл-14	89	R95,569,000.00																	15-Апр-14	12-Июл-14
	Устройство наружных сетей	15-Апр-14	29-Май-14	45	R65,569,000.00																	15-Апр-14	29-Май-14
	Устройство н.с. сетей связи и сигнализации (слаботочка, пожбез и т.д.)	15-Апр-14	29-Май-14	45	R6,987,000.00																	15-Апр-14	29-Май-14
A22830	Устр. слаботочных сетей	15-Апр-14	29-Май-14	45	R6,987,000.00																	15-Апр-14	29-Май-14
	Устройство н.с. электроснабжения	15-Апр-14	29-Май-14	45	R21,828,000.00																	15-Апр-14	29-Май-14
A22820	Устр. электроснабжения	15-Апр-14	29-Май-14	45	R21,828,000.00																	15-Апр-14	29-Май-14
	Газоснабжение	15-Апр-14	29-Май-14	45	R7,888,000.00																	15-Апр-14	29-Май-14
A22840	Устройство газоснабжения	15-Апр-14	29-Май-14	45	R7,888,000.00																	15-Апр-14	29-Май-14

■ Remaining Level of Effort    ■ Actual Work    ■ Critical Remaining ...  
■ Actual Level of Effort    ■ Remaining Work    ◆ Milestone










## Календарный график реализации проекта АПК Новая Жизнь

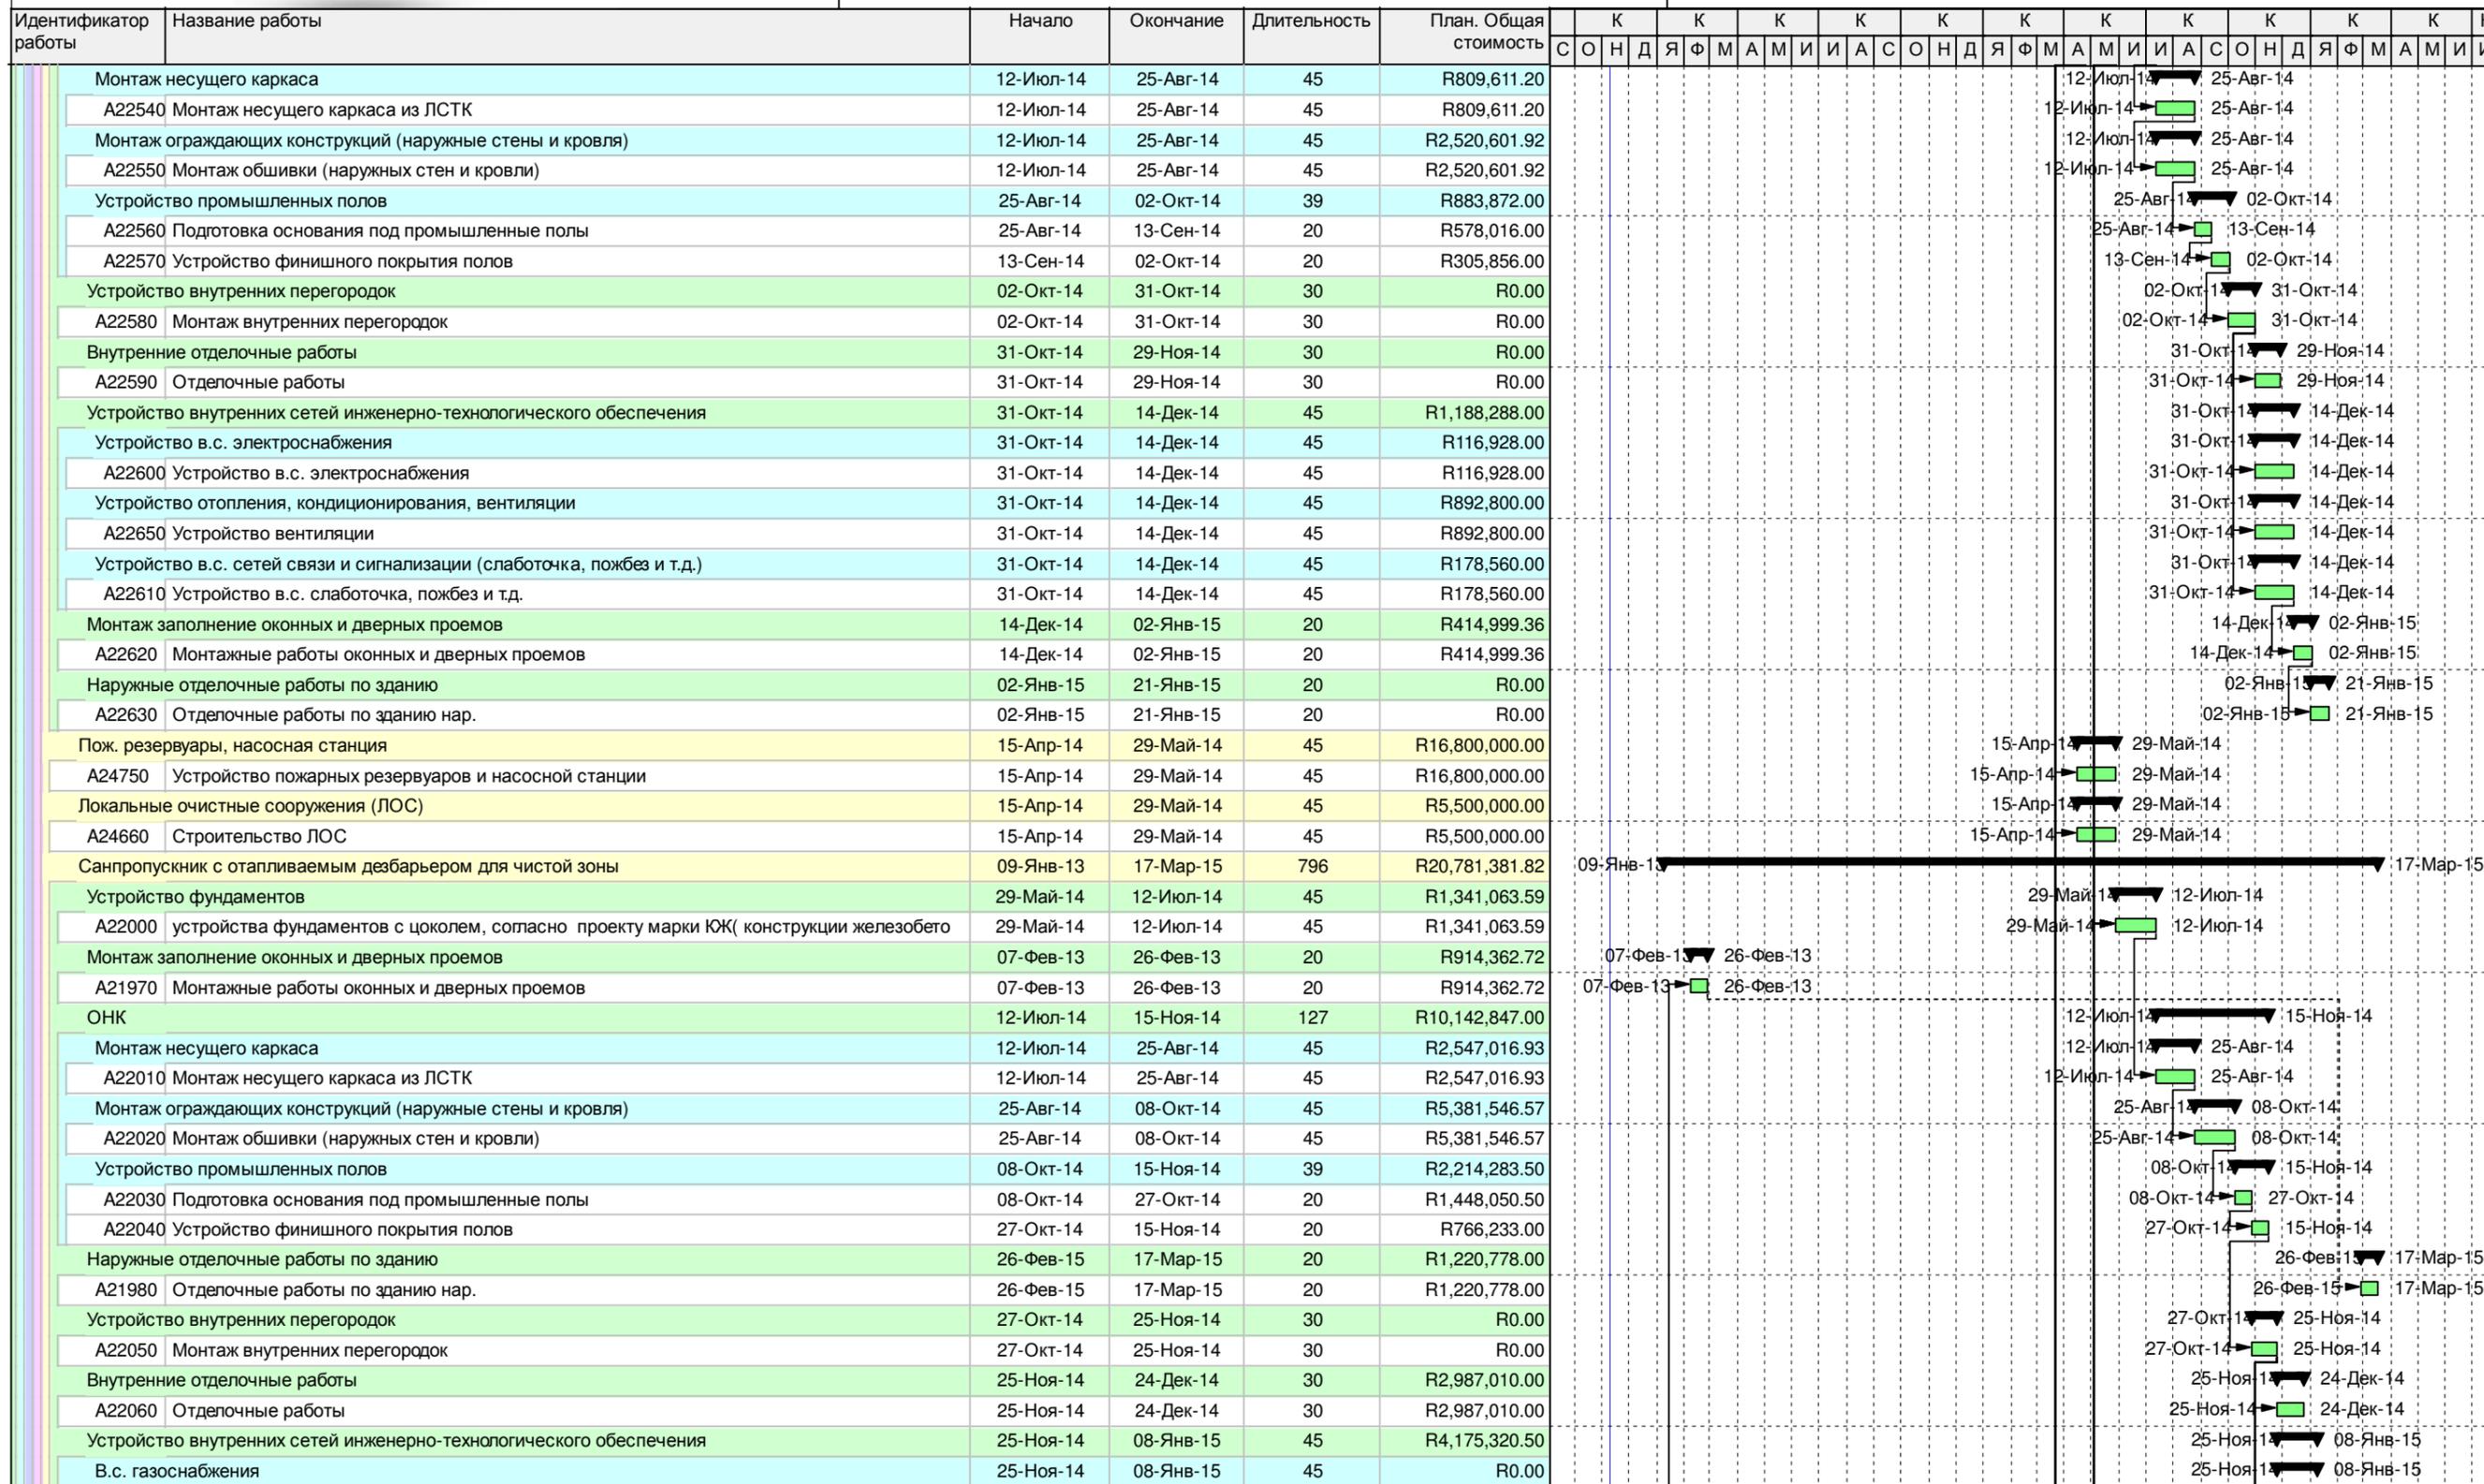

█ Remaining Level of Effort   
█ Actual Work   
█ Critical Remaining ...  
█ Actual Level of Effort   
█ Remaining Work   
◆ Milestone

















